

Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP

Julio 2023


Proyecto PROFIP

Resumen Presupuestario a julio 2023

Componente	Programado a Julio PAI 2023	Codificado Esigef	Certificado	Comprometido	Anticipos Entregados	Devengado	Pagado	Disponible	% Ejecución Devengado vs. Programado PAI 2023
C3.1 Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE.	57.577,44	847.994,46	584.226,32	100.760,53	0,00	57.577,44	57.577,44	163.007,61	100,00%
C3.2 Fortalecer la Defensa legal del Estado.	2.399,06	59.399,06		2.399,06	0,00	2.399,06	2.399,06	57.000,00	100,00%
C3.3 Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE.	0,00	45.000,00	44.992,20		0,00	0,00		7,80	-
C3.4 Fortalecer los centros de mediación de la PGE.	2.366,12	44.099,77	0,00	11.830,56	0,00	2.366,11	2.366,11	32.269,21	-
C3.5 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE.	20.641,60	20.641,60		20.641,60	0,00	20.641,60	20.641,60	0,00	100,00%
TOTAL PROFIP	82.984,22	1.017.134,89	629.218,52	135.631,75	0,00	82.984,21	82.984,21	252.284,62	100,00%

% Avance

Codificado: USD 1.017.134,89
Devengado: USD 82.984,21

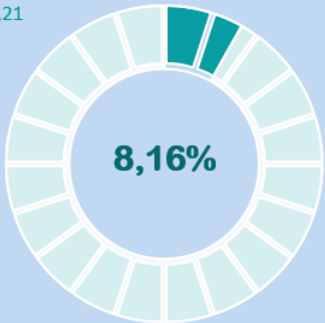

Fortalecimiento Institucional de la PGE



- El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, el tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”.
- El proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 2023.
- En aplicación del Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de 2020, se realizó la priorización y reprogramación de los procesos que financia el contrato 4812/OC-EC, con esta modificación al préstamo original, el monto pasó a ser de USD 4.933.036 millones; con el que se financia el valor neto e IVA del proyecto de “Fortalecimiento Institucional de la PGE” (PROFIP).
El 02 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0974-OF, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, en el cual se detalla la nueva programación del proyecto por un valor de USD 4.947.810,58, para su ejecución entre los años 2019 al 2023.
- Mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0098-O del 30 de agosto de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de actualización de prioridad para el Proyecto de inversión, con el cual se amplía el plazo de ejecución hasta el año 2024, así como también se homologan los indicadores y metas con los instrumentos aprobados por BID.
- En mayo 2023, se valida por parte de BID la recategorización de recursos por lo que el presupuesto total del proyecto pasa a ser de USD 5.160.020,91 para el período 2019-2024.
- En el mes de junio se validó la reforma de devolución de techo presupuestario planteada por la Procuraduría General del Estado, en función de los cronogramas de ejecución de las actividades programadas para su inicio en el presente año, de esta forma el monto codificado del proyecto disminuyó en un 37%, por lo que el presupuesto codificado al mes de junio y que se mantuvo para julio es de USD 1.017.134,89.
- El porcentaje de ejecución frente al monto total codificado vigente al cierre del mes de julio es del 8,16%, cuyo valor devengado asciende a USD 82.984,21; mientras que el porcentaje alcanzado versus al monto programado para su ejecución al mes de julio fue del 100%.

Proyecto PROFIP



Estado de los procesos contractuales a julio 2023:

Componente 1:

1. Proceso de “Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado”, con fecha 10 de julio 2023 finalizó la Negociación del contrato y con fecha 31 de julio BID emitió la No Objeción al contrato Negociado / FASE PRECONTRACTUAL.
2. Proceso de “Adquisición del parque informático, usuario final a nivel nacional de la Procuraduría General del Estado”, BID emitió la No Objeción al documento de licitación con fecha 19 julio 2023, la máxima autoridad emitió el aval correspondiente con fecha 27 julio 2023, actualmente se están gestionando las certificaciones presupuestarias para avanzar con el proceso. / FASE PREPARATORIA.
3. Especialistas de Tecnologías (Apoyo Implementación Agenda Digital), la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información se encuentra elaborando los TDRs de 6 especialistas que apoyarían la implementación del Sistema Nacional de Defensa Jurídica. / FASE PREPARATORIA.
4. Proceso de “Servicios de capacitación en herramientas prospectivas para la innovación y gestión del cambio institucional, formación y acompañamiento al Grupo Anfitrión, servidores de la PGE y aliados estratégicos en el marco de la Procuraduría del Futuro”, actualmente se están actualizando las Especificaciones Técnicas y cotizaciones respectivas. / FASE PREPARATORIA.
5. Especialista de Adquisiciones; Especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación; Especialista de Monitoreo y Seguimiento; y Especialista Financiero, en julio 2023 se gestionó el pago del producto correspondiente a la gestión realizada en el mes de junio de 2023. / PROCESO EN EJECUCIÓN

Componente 2:

1. Contratación del “Especialista en procesos de capacitación para apoyar y asesorar técnicamente al EDG-PGE”, contrato finalizado en diciembre 2022. Con fecha 05 abril 2023 se emitió el aval y las certificaciones presupuestarias. Con fecha 25 abril 2023 se efectuó el pago pendiente del producto 04. / PROCESO FINALIZADO.

Componente 3:

1. Proceso “Servicio de capacitación especializada en materia de mediación, como mecanismo eficiente y válido para la solución de conflictos que involucran instituciones del sector público”, se encuentra en revisión por parte del área requirente (DNM). / FASE PREPARATORIA.
2. Proceso “Servicio de capacitación especializada en los usos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) para la defensa jurídica del Estado”, se encuentra en revisión por parte del área requirente. / FASE PREPARATORIA.
3. Proceso “Servicio de capacitación para fortalecer las competencias de asesoría y defensa jurídica de la Procuraduría General del Estado en materia de Derecho Tributario”, se encuentra en revisión por parte del área requirente. / FASE PREPARATORIA.
4. Proceso “Servicios de logística, producción y ejecución del evento “Simposio Internacional: La protección del interés público en el Estado Constitucional de Derecho””, con fecha 12 julio 2023 BID emitió la No Objeción a las especificaciones técnicas, con fecha 13 julio 2023 la máxima autoridad emitió el aval, con fecha 14 de julio 2023 se emitió las certificaciones presupuestarias, la fecha máxima para recibir ofertas es el 01 agosto 2023. / FASE PRECONTRACTUAL.

Componente 4:

1. Proceso “Consultoría para la elaboración del diseño de readecuación integral de las oficinas del centro de mediación en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Riobamba y Portoviejo de la Procuraduría General del Estado (PGE)”, Con fecha 06 junio 2023 se firmó el contrato, con una duración de 90 días. Con fecha 14 julio 2023 el proveedor entregó el producto No. 2 y 3, el mismo que actualmente se encuentra en proceso de gestión de pago. / PROCESO EN EJECUCIÓN.

Componente 5:

1. Proceso “Desarrollar productos comunicacionales”, se firmó el contrato en el mes de noviembre 2022 entregándose el anticipo del 40%, el plazo contractual venció el 05 enero 2023. El 15 de marzo 2023 el Administrador de contrato realizó la solicitud de pago. Con fecha 21 de marzo 2023 la Dirección Nacional Financiera solicitó el pago respectivo en el sistema Esigef del MEF. / PROCESO FINALIZADO.
